

Roadmap Medicatieveiligheid

Versie 21 april 2005

De uitkomsten van de risicoanalyse (FMEA) door de commissie geneesmiddelendistributie zijn door Raad van Bestuur en Bestuur Medische Staf overgenomen.

Elf verbeteringen moeten worden gerealiseerd om de belangrijke risico's weg te nemen. Hier wordt daartoe een roadmap gepresenteerd.

Om te overzien welke eisen aan de inbedding van acties en projecten in Atrium medisch centrum moeten worden gesteld wordt onderscheid gemaakt naar aard en ingrijpendheid van de te realiseren verbeteringen. Dat levert onderstaande indeling op.


Aard	Ingrijpendheid	
	Majeure verandering	Enkelvoudige verbetering/voortzetten ingeslagen weg.
Specifiek geneesmiddelen	EVS Robotisering uitzetten Satelliet farmacie	Standaard oplossingen voor i.v./spuitenpomp ASP ZAPO VTGM SABU
Bredere functie voorzien	EPD ETR SPAR & VIM patiëntenidentificatie	Informatie (over geneesmiddelen) op de werkplek

Majeure veranderingen vergen een project-aanpak voor sturing (commissie/stuurgroep), uitvoering (projectgroep) en inhoudelijke informatievoorziening (Accolade IP).

In de hieronder afgebeelde projectstructuur zijn betreffende acties goed te plaatsen. De commissie Geneesmiddelendistributie geeft rechtstreeks sturing aan die majeure veranderingen welke specifiek geneesmiddelen betreffen (EVS, ZAPO en robotisering) en heeft een klant-leverancier verhouding met de Stuurgroep Patiëntidentificatie. EVS en robotisering zijn immers afhankelijk van adequate identificatie van de patiënt en registratie van toediening (ETR).

De projectgroepen VIM (reeds gestart) en SPAR (i.o.) worden samen met de Stuurgroep patiëntveiligheid aangestuurd, opdat deze werkwijzen om van fouten te leren ook voldoende gericht zullen werken voor geneesmiddelen-fouten en veranderingen de uniformiteit binnen Atrium medisch centrum niet verstoren. Voor het EPD zal de commissie Geneesmiddelendistributie om dezelfde redenen samen met de Stuurgroep PZ systemen als opdrachtgever optreden.


Overzicht van de projectstructuur voor de majeure veranderingen t.b.v. medicatieveiligheid

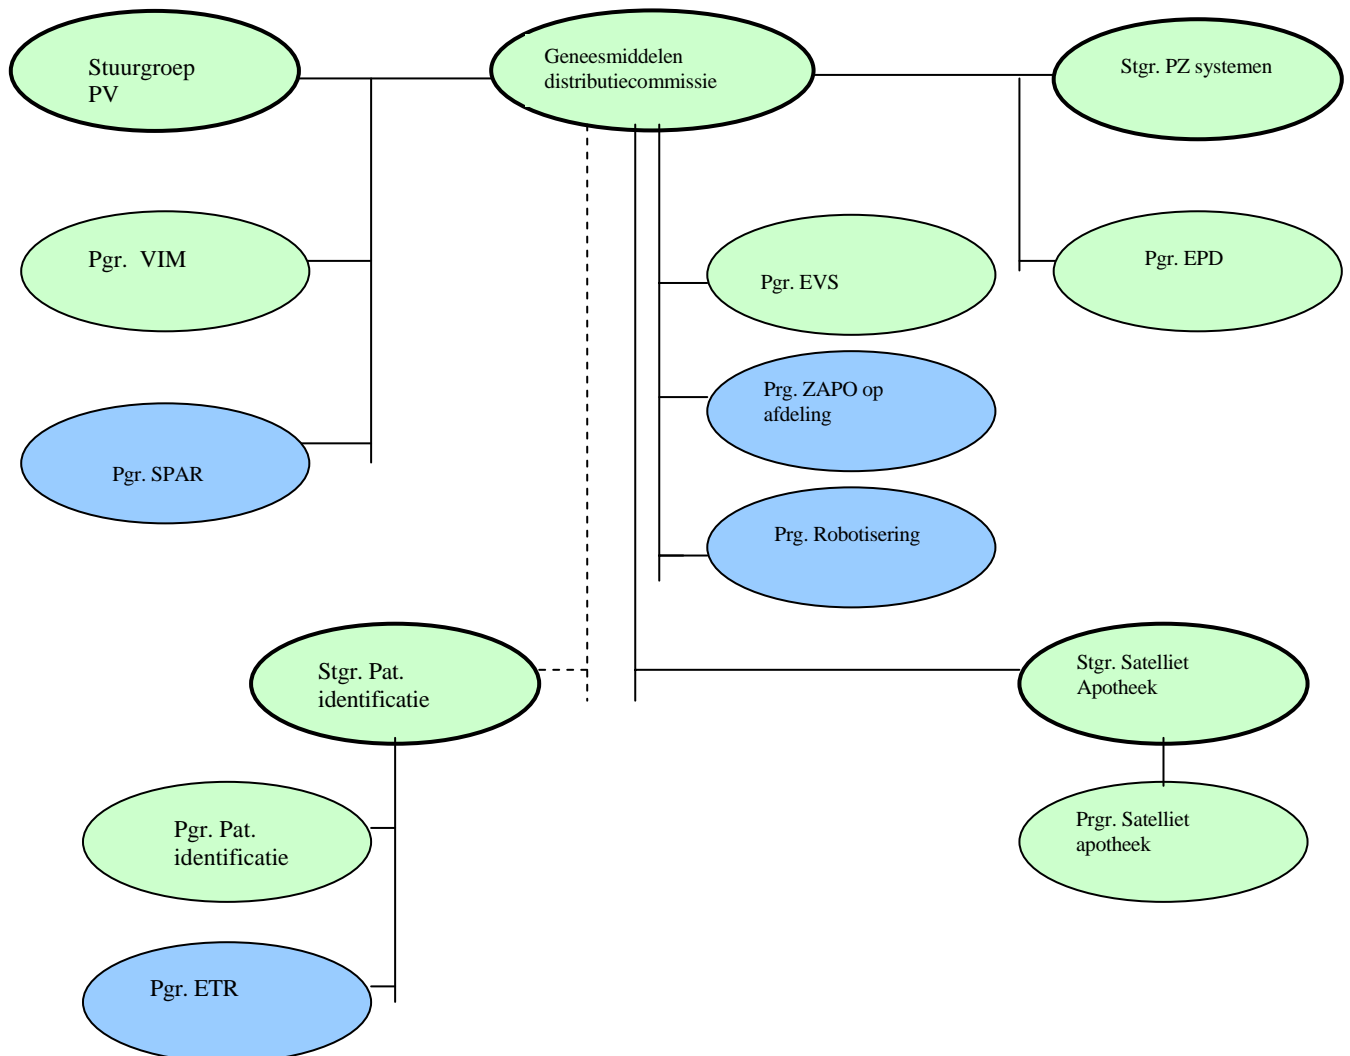


Groen = reeds opgericht/functionerend
Blauw = nog op te richten

Enkelvoudige verbeteringen en voortzetting van lopende ontwikkelingen kunnen op reguliere wijze worden gemanaged. De apotheek trekt de standaardisatie van intraveneuze oplossingen zelf. Het bestuur ASP zet de ontwikkeling van het Servicepunt zelf voort. De afdeling Informatisering voorziet in informatie op alle relevante werkplekken. De apotheek definieert de specificaties die voor haar werkerterrein van belang zijn. Zie hieronder.

Overzicht van acties vanuit reguliere organisatie

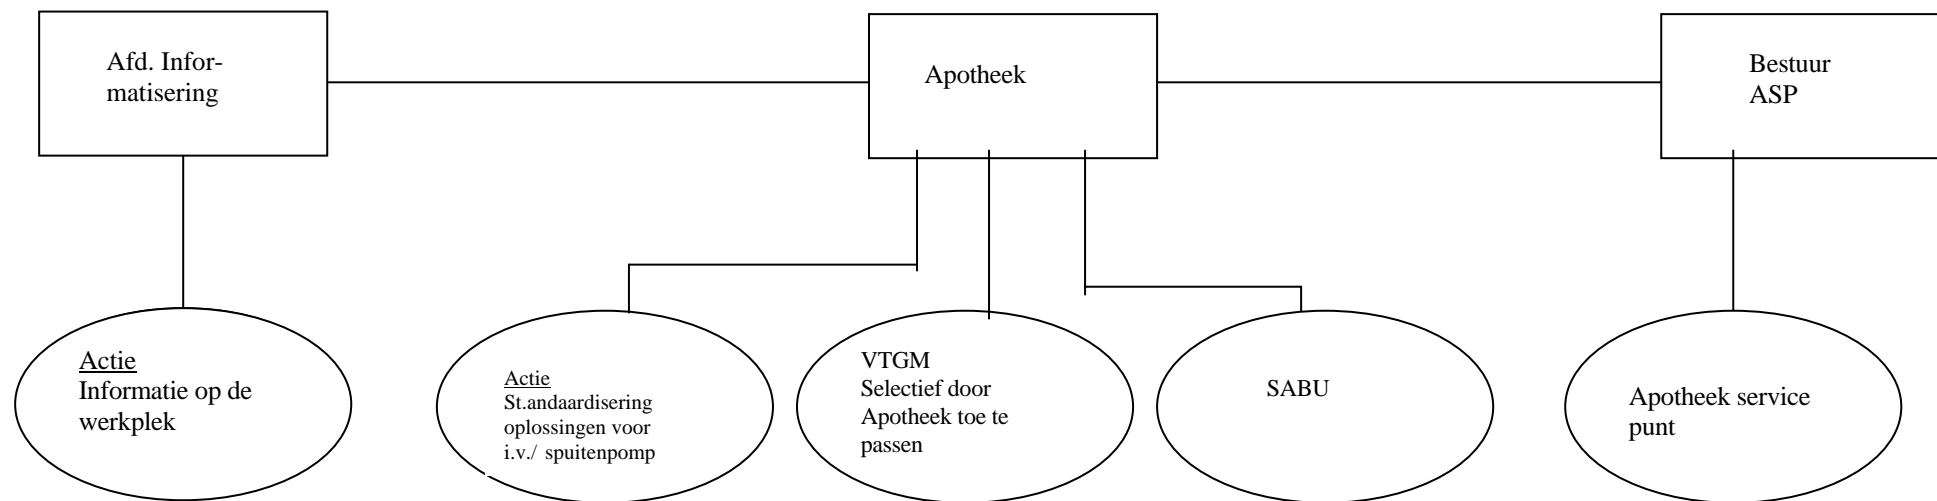

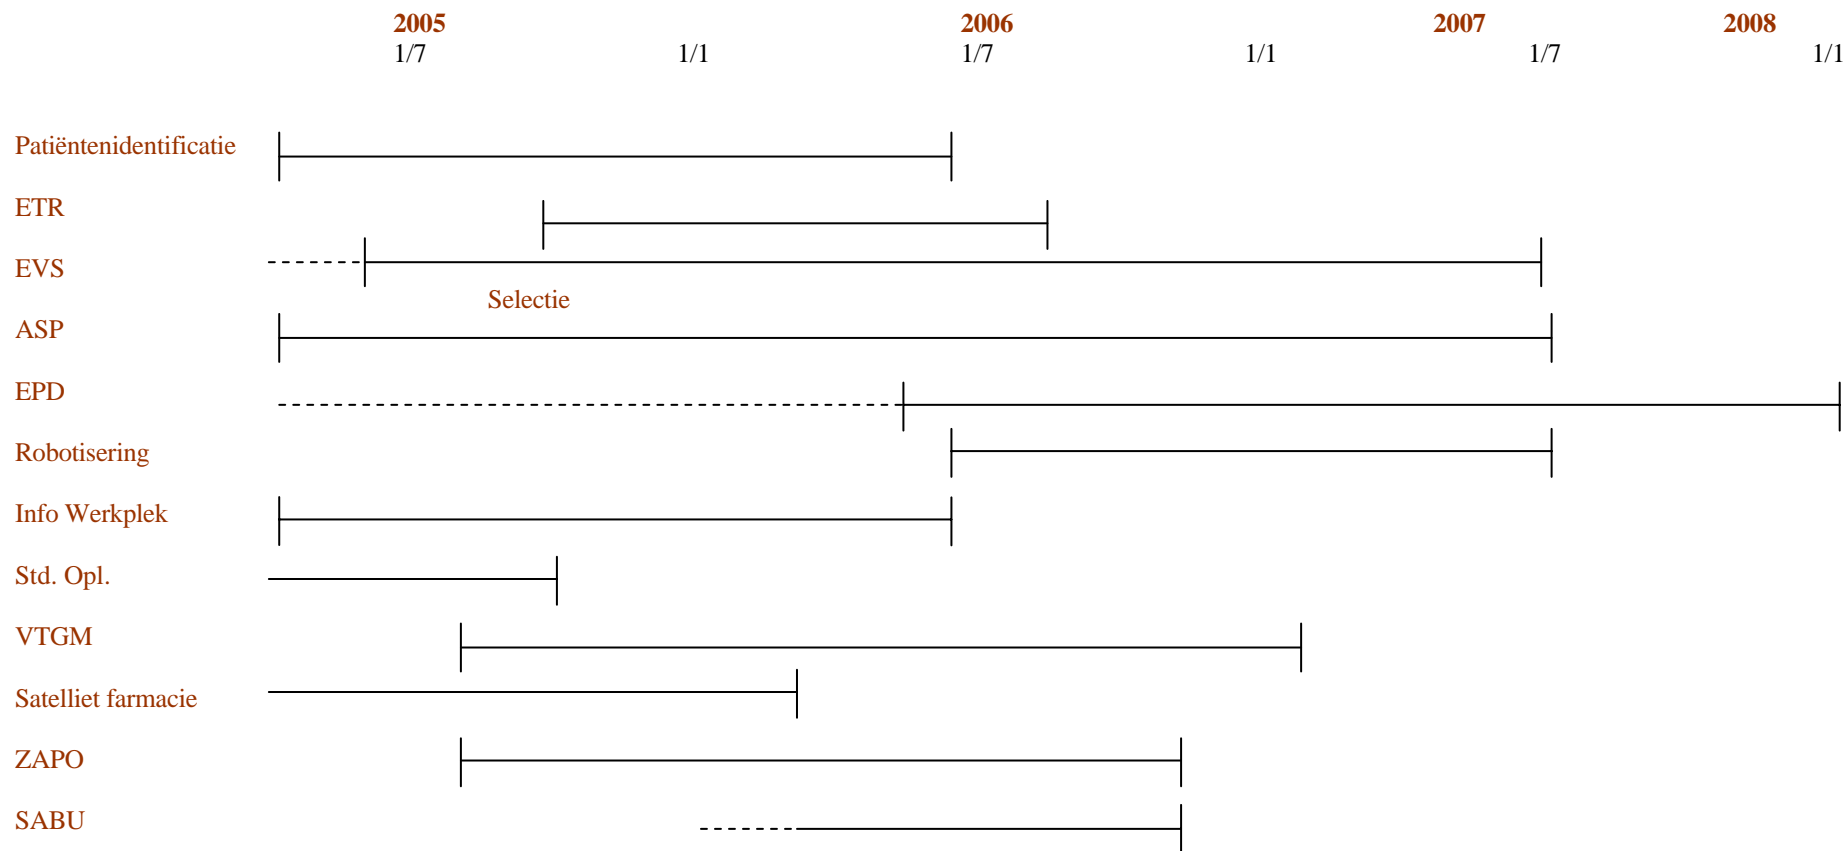

NvW129-05/FH
8 april 2005

Gebruikte afkortingen

EVS	Electronisch VoorschrijfSysteem
ASP	Apotheek Service Punt
ZAPO	ZiekenhuisAPotheker Op de afdeling
VTGM	Voor Toediening GereedMaken door de apotheek
SABU	Satelliet Apotheek BereidingsUnits
EPD	Electronisch Patiënten Dossier
ETR	Electronische ToedieningsRegistratie
SPAR	Structureel PATiëntenRisico
VIM	Vrijwillige IncidentenMelding
PZ systemen	PatiëntenZorgsystemen
PV	PatiëntVeiligheid
